

In der Senatssitzung am 24. November 2020 beschlossene Fassung

Der Senator für Finanzen

10.11.2020

Vorlage für die Sitzung des Senats am 24.11.2020

**„Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I)
hier: Umsetzungsstand per 30.06.2020“**

A. Problem

Der Senat hat am 16.02.2016 im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes im Land Bremen die Projektlisten der beiden Städte Bremen und Bremerhaven beschlossen und um halbjährliche Berichterstattung zum Projektumsetzungsstand gebeten.

B. Lösung

Die Programmmittel können in folgenden möglichen Bereichen eingesetzt werden:

- I. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
(Krankenhäuser, Lärmschutz, Luftreinhaltung, energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturmaßnahmen, etc.)

- II. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur
(frühkindliche Infrastruktur, energetische Sanierung der Schulinfrastruktur bzw. Weiterbildungseinrichtungen, Modernisierung v. überbetrieblichen Berufsbildungsstätten, etc.)

Auf Grundlage der aktuellen Beschlüsse von Bundestag und Bundesrat (am 27.03.2020) wurden die Fristen des Programmes um ein Jahr verlängert.

Das Programm ist nunmehr befristet bis 31.12.2021 (Bauabnahme) bzw. 31.12.2022 (Abrechnung zwischen Land Bremen und dem Bundesfinanzministerium - BMF).

Berichtspflichten gegenüber dem Bundesfinanzministerium (BMF)

Gemäß §6 der VV zur Durchführung des KInvFG sind die Bundesländer verpflichtet, abgeschlossene Maßnahmen jeweils jährlich bis 2021 zum Stichtag 01.Oktober und 01.April an das Bundesfinanzministerium zu melden. Das Bundesfinanzministerium prüft auf Grundlage dieser Meldungen der Bundesländer die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel.

Zum Stichtag 01.10.2020 wurde von den projektbetreuenden Einheiten folgendes fertiggestellte Projekt an das BMF gemeldet.

Bremerhaven, Freizeittreff Eckernfeld, energetische Deckensanierung T€ 17,5

Weitere Projekte sind zwar abgeschlossen, befinden sich aber noch in Abrechnungsphase. Diese Projekte können dem Bundesfinanzministerium jederzeit gemeldet werden. Von den derzeitigen 41 KInvFG-I-Projekten sind somit 19 (Status 6 und besser) abgeschlossen. Dies entspricht einer Quote von ca. 46 %.

Änderungen im Projektportfolio (Bremerhaven)

Auf Wunsch der Stadt Bremerhaven sollen die bei den Projekten


30 – Fritz-Reuter-Schule: Fenstersanierung (912€) sowie

36 – Fritz-Reuter-Schule: Dachsanierung (27.975€),

verbliebenen Restmittel in Höhe von insgesamt 28.886 €, zur Fassadensanierung der Fritz-Reuter-Schule verwendet werden.

Projektstatus per 30.06.2020

Auf Grundlage der Rückmeldungen der projektdurchführenden Einheiten / Dienststellen / Ressorts sowie der vorgenannten Änderungsvorschläge im Projektportfolio ergibt sich folgender Umsetzungsstatus der Maßnahmen im KInvFG I:

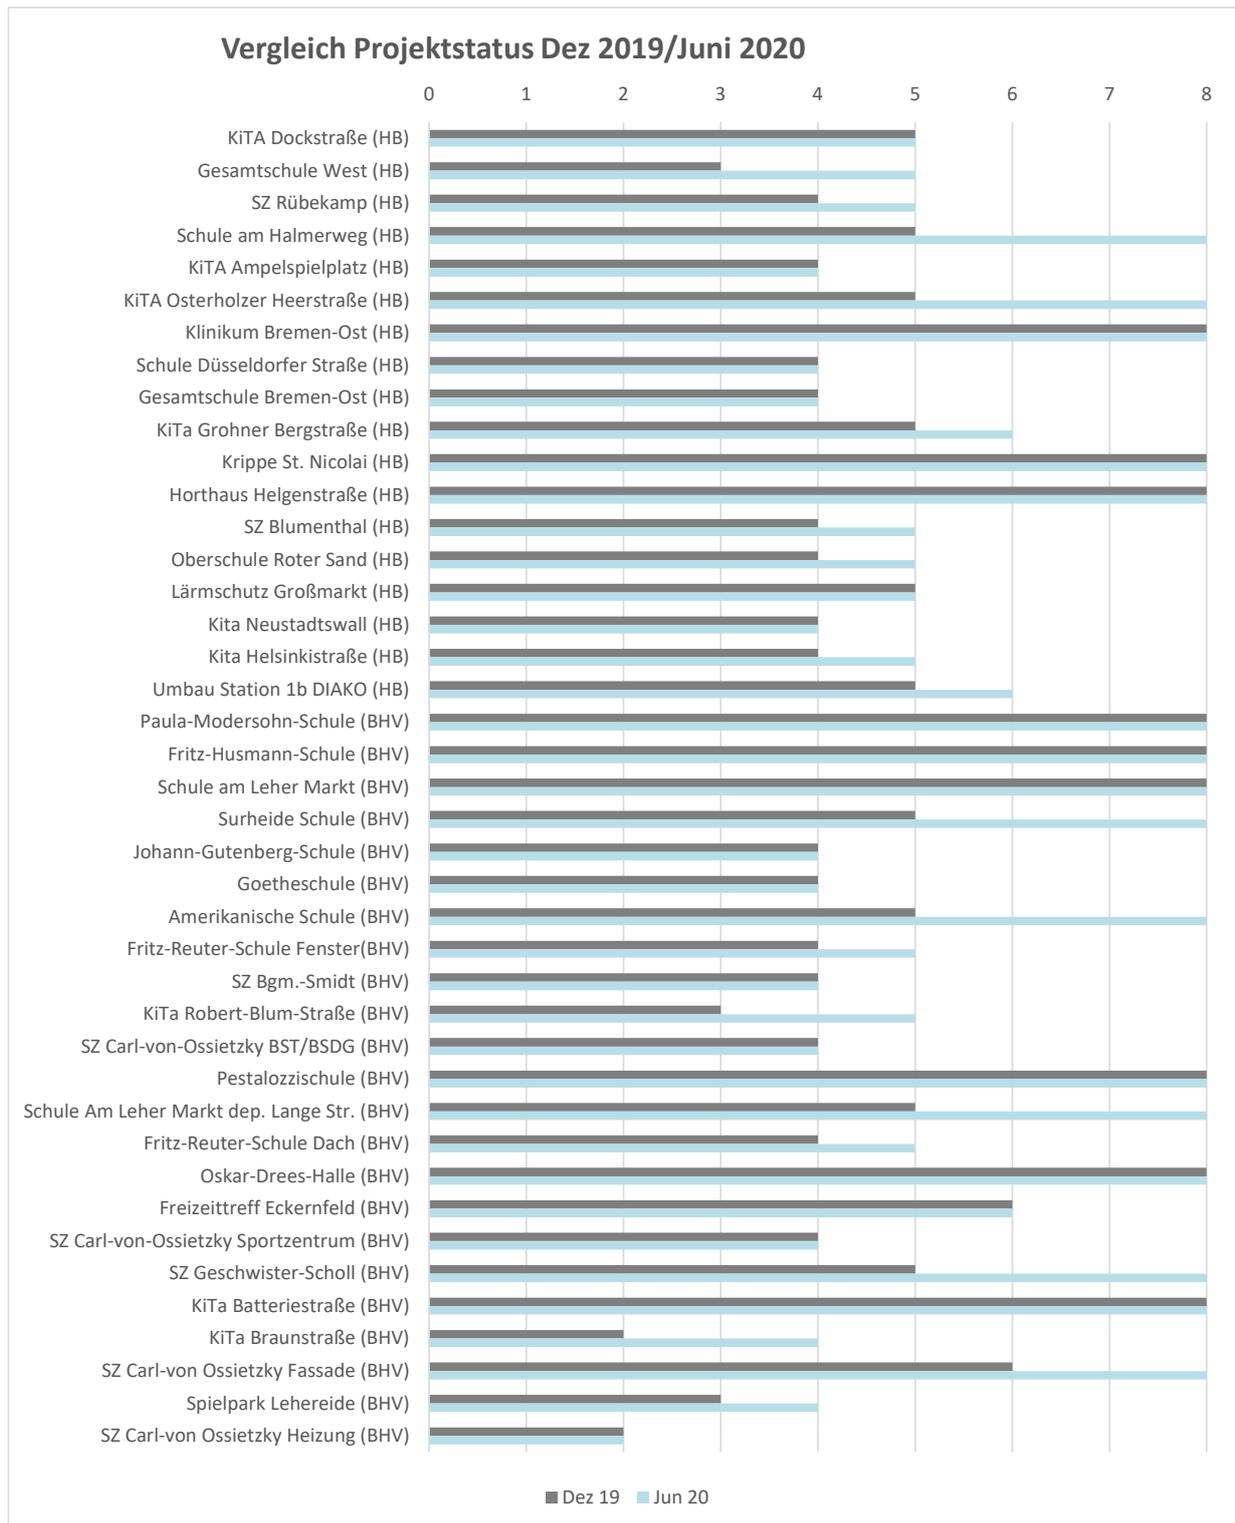

Die Statusmeldungen stellen den jeweiligen Projektfortschritt dar:

- 0 = geplant,
- 1 = Planungsmittel bewilligt
- 2 = freigegeben
- 3 = Ausschreibung läuft
- 4 = Baubeginn erfolgt
- 5 = Abschluss der Baumaßnahmen
- 6 = Vorstellung und Prüfung des Projektes beim / durch das BMF
- 7 = evtl. Rückfragen seitens des BMF
- 8 = abschließende Genehmigung durch das BMF = Projektabschluss

Mittelabruf per 30.06.2020 beim Bundesministerium für Finanzen (BMF)

Bis zum 30.06.2020 wurden vom Land Bremen auf Grundlage vorliegender Rechnungen bei den projektdurchführenden Ressorts, Dienststellen und Gesellschaften rund 35,4 Mio. € von der Bundeskasse (= 91,2% des Programmvolumens für das Bundesland Bremen) abgerufen.

Die Aufschlüsselung des Mittelabflusses auf Projektebene stellt die folgende Tabelle dar (2016 bis 2020: Ist-Daten, 2021: Planwerte):

Mittelabfluss im Kommunalinvestitionsförderprogramm I

Maßnahme	Status	Ist 2016 bis			Gesamt
		2019	IST 2020	Plan 2021	
KiTA Dockstraße	5	2.370.425,00	0,00	0,00	2.370.425,00
Gesamtschule West	5	7.000,00	82.000,00	161.000,00	250.000,00
SZ Rübekamp	5	1.800.000,00	200.000,00	200.000,00	2.200.000,00
Schule am Halmerweg	8	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
KiTA Ampelspielplatz	4	1.260.000,00	4.500.000,00	1.111.380,00	6.871.380,00
KiTA Osterholzer Heerstraße	8	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Klinikum Bremen-Ost	8	3.888.584,77	0,00	0,00	3.888.584,77
Schule an der Düsseldorfer Straße	4	1.240.926,02	970.000,00	13.511,98	2.224.438,00
Gesamtschule Bremen-Ost	4	1.300.000,00	2.380.000,00	403.718,00	4.083.718,00
KiTa Grohner Bergstraße	6	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Krippe St. Nicolai	8	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Horthaus Helgenstraße	8	156.151,00	0,00	0,00	156.151,00
SZ Blumenthal	5	160.000,00	8.267,00	31.733,00	200.000,00
Oberschule Roter Sand	5	60.000,00	0,00	140.000,00	200.000,00
Lärmschutz Großmarkt	5	537.188,27	0,00	62.811,73	600.000,00
KiTa Neustadtswall	4	1.750.000,00	1.800.000,00	227.000,00	3.777.000,00
KiTa Helsinkistraße	5	2.550.000,00	160.000,00	0,00	2.710.000,00
Umbau Station 1B im DIAKO	6	0,00	111.415,23	0,00	111.415,23
Paula-Modersohn-Schule	8	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Fritz-Husmann-Schule	8	40.283,28	0,00	0,00	40.283,28
Schule am Leher Markt	8	121.904,20	0,00	0,00	121.904,20
Surheide Schule	8	69.908,16	91,84	0,00	70.000,00
Johann-Gutenberg-Schule	4	85.210,46	62.744,02	2.045,52	150.000,00
Goetheschule	4	0,00	57.679,88	22.320,12	80.000,00
Amerikanische Schule	8	48.129,06	1.870,94	0,00	50.000,00
Fritz-Reuter-Schule	5	248.287,65	0,00	29.686,74	277.974,39
SZ Bgm.-Smidt	4	120.727,14	688.173,45	657.099,41	1.466.000,00
KiTa Robert-Blum-Straße	5	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SZ Carl-von-Ossietzky BST und BSDG	4	2.004.053,32	56.355,22	139.591,46	2.200.000,00
Pestalozzische Schule	8	198.682,49	0,00	0,00	198.682,49
Schule Am Leher Markt dep. Lange Str.Dachsanierung	8	181.618,50	0,00	0,00	181.618,50
Fritz-Reuter-Schule Dachsanierung	5	64.265,55	7.760,06	0,00	72.025,61
Oskar-Drees-Sporthalle	8	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Freizeittreff Eckernfeld	6	17.481,34	0,00	0,00	17.481,34
SZ Carl-von-Ossietzky Sportzentrum	4	9.600,37	47.392,04	193.007,59	250.000,00
SZ Geschwister-Scholl	8	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
KiTa Batteriestraße	8	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
KiTa Braunstraße	4	12.366,70	1.500,00	236.133,30	250.000,00
SZ Carl-von-Ossietzky, energetische Sanierung der Fassade	8	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Spielpark Leherheide	4	0,00	116.001,76	64.316,90	180.318,66
SZ Carl-von-Ossietzky BSDGG Heizungsanlage	2	2.200,00	-2.200,00	59.711,53	59.711,53
SUMME		27.754.993,28	11.549.051,44	3.755.067,28	43.059.112,00

Bundesrechnungshof

Der Bundesrechnungshof setzt seine Prüftätigkeit unverändert fort.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Der Bericht zum Umsetzungsstand hat unmittelbar keine finanziellen und personalwirt-

schaftlichen Auswirkungen. Der dargestellte Umsetzungsstand hat keine Auswirkungen auf die Geschlechter.

E. Beteiligung und Abstimmung

Die Abstimmung der Vorlage mit der Senatskanzlei, der Senatorin für Kinder und Bildung, dem Magistrat der Stadt Bremerhaven sowie Immobilien Bremen und Seestadt Immobilien ist erfolgt.

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Geeignet.

G. Beschluss

1. Der Senat nimmt den Umsetzungsbericht per 30.06.2020 zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I) im Land Bremen zur Kenntnis und stimmt den Portfolioänderungen zu.
2. Der Senator für Finanzen wird gebeten, die entsprechende haushaltsmäßige Umsetzung vorzunehmen.
3. Der Senat bittet den Senator für Finanzen um Weiterleitung des Umsetzungsberichtes an den Haushalts- und Finanzausschuss.
