

In der Senatssitzung am 22. Juni 2021 beschlossene Fassung

Der Senator für Finanzen

14.06.2021

Vorlage für die Sitzung des Senats am 22.06.2021

„Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) hier: Umsetzungsstand per 31.03.2021“

A. Problem

Der Senat hat am 06.02.2018 im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II im Land Bremen die Projektlisten der beiden Städte Bremen und Bremerhaven beschlossen. Der Haushalts- und Finanzausschuss hat im Rahmen seiner Beratung der Vorlage am 16.02.2018 um halbjährliche Berichterstattung zum Projektumsetzungsstand (beginnend ab dem 31.12.2018) gebeten.

B. Lösung


Rahmendaten des Programmes

Die Programmmittel aus KInvFG II können ausschließlich zur Sanierung, dem Umbau sowie ausnahmsweise für den Ersatzbau von (allgemein- und berufsbildenden) Schulen eingesetzt werden. Auf Grundlage der aktuellen Beschlüsse von Bundestag und Bundesrat (am 27.03.2020) wurden die Fristen des Programmes um ein Jahr verlängert. Das Programm ist nunmehr befristet bis 31.12.2023 (Bauabnahme) bzw. 31.12.2024 (Abrechnung) zwischen Land Bremen und dem Bundesfinanzministerium (BMF). Das KInvFG II-Programm ist (im Gegensatz zu KInvFG I) rein auf Schulbauten ausgerichtet und hat eine um 2 Jahre längere Laufzeit.

Projektstatus per 31.03.2021

Auf Grundlage der Rückmeldungen der projektdurchführenden Einheiten / Dienststellen / Ressorts ergibt sich folgender Projektumsetzungsstatus

Vergleich Status der Maßnahmen Juni 2020/März 2021

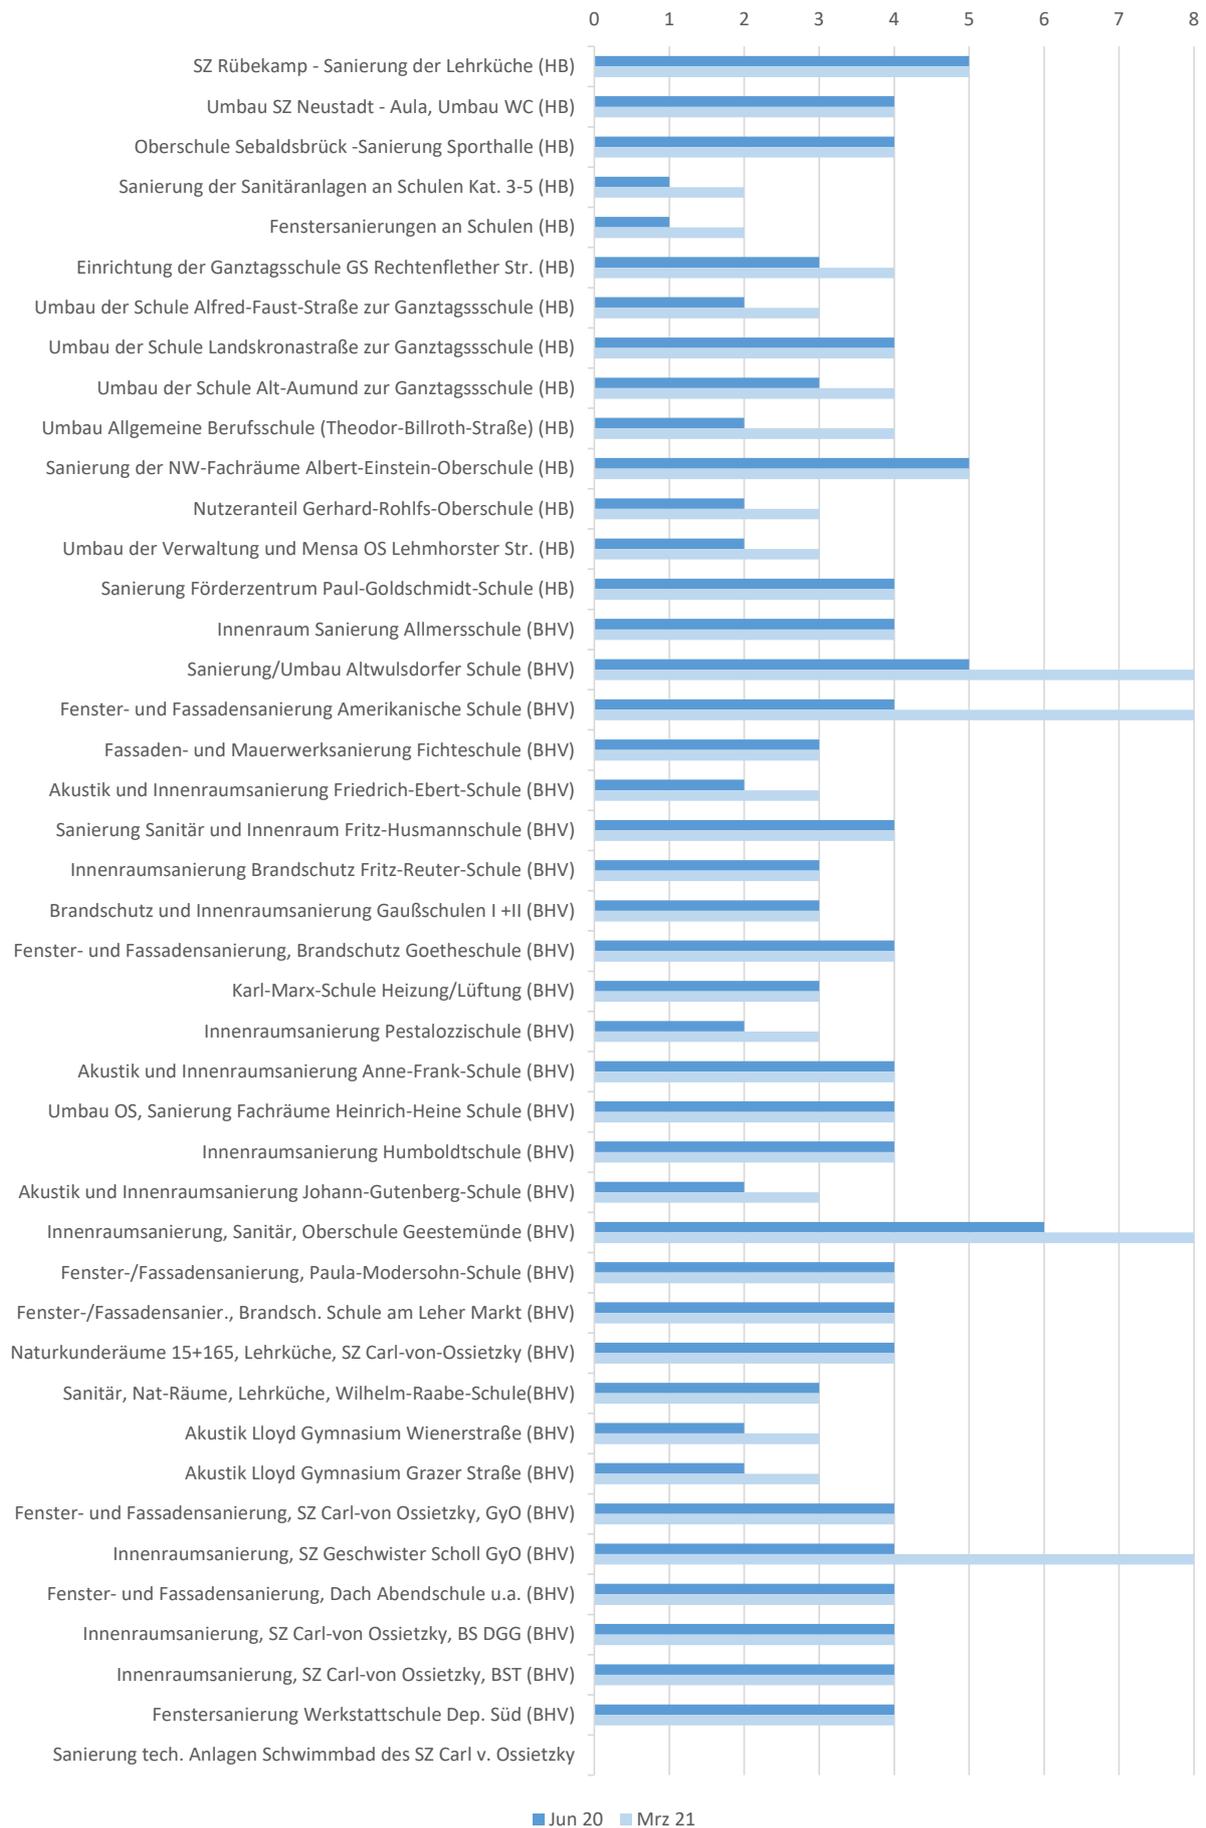

Die Statusmeldungen stellen den jeweiligen Projektfortschritt dar:

- 0 = geplant,
- 1 = Planungsmittel bewilligt
- 2 = freigegeben
- 3 = Ausschreibung läuft
- 4 = Baubeginn erfolgt
- 5 = Abschluss der Baumaßnahmen
- 6 = Vorstellung und Prüfung des Projektes beim / durch das BMF
- 7 = evtl. Rückfragen seitens des BMF
- 8 = abschließende Genehmigung durch das BMF = Projektabschluss

Mittelabruf aktuell beim Bundesministerium für Finanzen (BMF)

Per 31.03.2021 wurden vom Land Bremen auf Grundlage vorliegender Rechnungen bei den projektdurchführenden Ressorts, Dienststellen und Gesellschaften rund 14,1 Mio.€ von der Bundeskasse (= 33,3 % des Programmvolumens für das Bundesland Bremen) abgerufen.

Berichtspflichten gegenüber dem Bundesfinanzministerium (BMF)

Gemäß §6 der VV zur Durchführung des KInvFG sind die Bundesländer verpflichtet, abgeschlossene Maßnahmen jeweils jährlich zum Stichtag 01.Oktober und 01.April an das Bundesfinanzministerium zu melden. Das Bundesfinanzministerium prüft auf Grundlage dieser Meldungen der Bundesländer die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel.

Es wurden bislang 4 Projekte aus Bremerhaven als abgeschlossen gemeldet, vom Bund geprüft und nicht beanstandet.

Änderungen im Projektportfolio

Bremen

Durch höhere Ausschreibungsergebnisse bzw. coronabedingte Enpässe ergeben sich Mehrkosten bei den Projekten Nr. 9 „Rechtenflether Straße“ (i.H.v. 239 T€) und 11. „Alfred-Faust-Straße“ (i.H.v. rd. 650 T€), die durch veränderte Priorisierung im Bereich der Projekte 6. „Sanitäranlagen an Schulen“ und 8. „Fenstersanierungen an Schulen“ kompensiert werden sollen. Die hier aus dem KInvFG II herausgenommenen Projekte

(„Sanitäranlagen Schaumburger Straße“ und „Tami-Oelfken-Schule“ sowie „Fens-
tersanierungen Schule am Weidedamm“) werden aus dem KInvFG II herausgenom-
men und zurückgestellt.

Bundesrechnungshof

Bislang sind keine neuen Aktivitäten / Berichte des Bundesrechnungshofes bekannt.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Der Bericht zum Umsetzungsstand hat unmittelbar keine finanziellen und personalwirt-
schaftlichen Auswirkungen. Der dargestellte Umsetzungsstand hat keine Auswirkun-
gen auf die Geschlechter.

E. Beteiligung und Abstimmung

Die Abstimmung der Vorlage mit der Senatskanzlei, der Senatorin für Kinder und Bil-
dung, dem Magistrat der Stadt Bremerhaven sowie Immobilien Bremen und Seestadt
Immobilien ist erfolgt.

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsge- setz

Geeignet.

G. Beschluss

1. Der Senat nimmt den Umsetzungsbericht per 31.03.2021 zum Kommunalinves-
titionsförderungsgesetz II (KInvFG II) im Land Bremen zur Kenntnis und stimmt
den vorgeschlagenen Portfolioänderungen zu.
2. Der Senat bittet den Senator für Finanzen um Weiterleitung des Umsetzungs-
berichtes an den Haushalts- und Finanzausschuss.
